

Projekt „Spitex SZ – Wege in die Zukunft“

Statusbericht

Empfänger: Gemeinden

StaBer.: 01-23

Stand: 31.03.2023

Inhaltsverzeichnis


3	Grundsätzliches
4 – 5	Projektbereich «Leistungen» - Status, Übersicht
6 – 7	Projektbereich «Personal» - Status, Übersicht
8 – 9	Projektbereich «Klient-Umfeld-Kultur» – Status, Übersicht
10 – 11	Projektbereich «Organisation/Wirtschaftlichkeit» – Status, Übersicht
12	Übersicht Engagement Spitex und Dritte
13	Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern
14	Controlling
15	Termine

Grundsätzliches

Projektverlauf	<ul style="list-style-type: none"> • Sofortmassnahmen22 abgeschlossen => siehe Beilage «WiZ Kurzbericht Sofortmassnahmen 2022» • Teilprojekte23 im Terminplan => keine Verzögerungen • Teilprojektteams gebildet, Aufgaben verteilt => Projektarbeit laufend • Kosten im Rahmen des Projektbudgets
Kultur, Engagement	<ul style="list-style-type: none"> • Grosses Engagement aller Involvierten => Projektgremien, Teilprojekte, Workshops, etc. • Spürbare Aufbruchsstimmung => Wollen bewegen, sich aktiv einbringen • Offenheit, Bereitschaft für Diskussionen unterschiedlicher Art
Projektmanagement	<ul style="list-style-type: none"> • Projektmanagement-Tool factro business bewährt sich => «driver seat», Darstellung, Reporting, Übersicht, Transparenz • Prozesse funktionieren => Zeiterfassung, Buchhaltung, Termine, etc. • Organisation spielt sich ein => Verband / Spitex-Basisorganisationen / Projektleitung • Buchhaltung / Controlling aufgesetzt => Betrieb
Reporting	<ul style="list-style-type: none"> • Individuelles Reporting => Projektgremien, SKSZ, Spitex-Geschäftsleitungen, Gemeinden, Sonstige • Versand quartalsweise => erstmalig Q1/23
Projektfinanzierung 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Vorbereiten Unterlagen => Gesuch an Gemeinden mit Projekt-Reporting, Kurzbericht Sofortmassnahmen 2022, Jahresprojektplan 2024, Rahmenkonzept • Versand an Gemeinden => Ende März23 • Nachfassen durch Geschäftsleitungen der Spitex Basisorganisationen

Projektbereich „Leistungen“ – Übersicht

Jahresprojektplanung 23/24

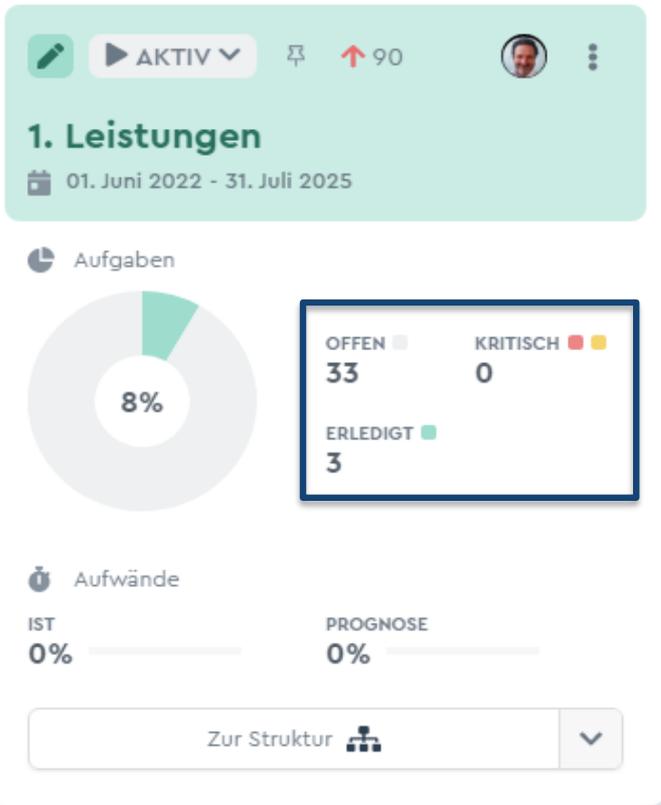

Teilprojekt «Kompetenz-/Leistungslandkarte»

- Dauer: 06-22 bis 12-22
- Status: Abgeschlossen, Ergebnisse kommuniziert

Teilprojekt «Palliative Care»


- Realisierung: 01-23 bis 03-24
- Status: Grundlagenarbeit

Teilprojekt «Nachtpikett»

- Realisierung: 01-23 bis 03-24
- Status: Workshop/Best practice


Projektbereich „Leistungen“ – Status

Jahresprojektplan 23/24

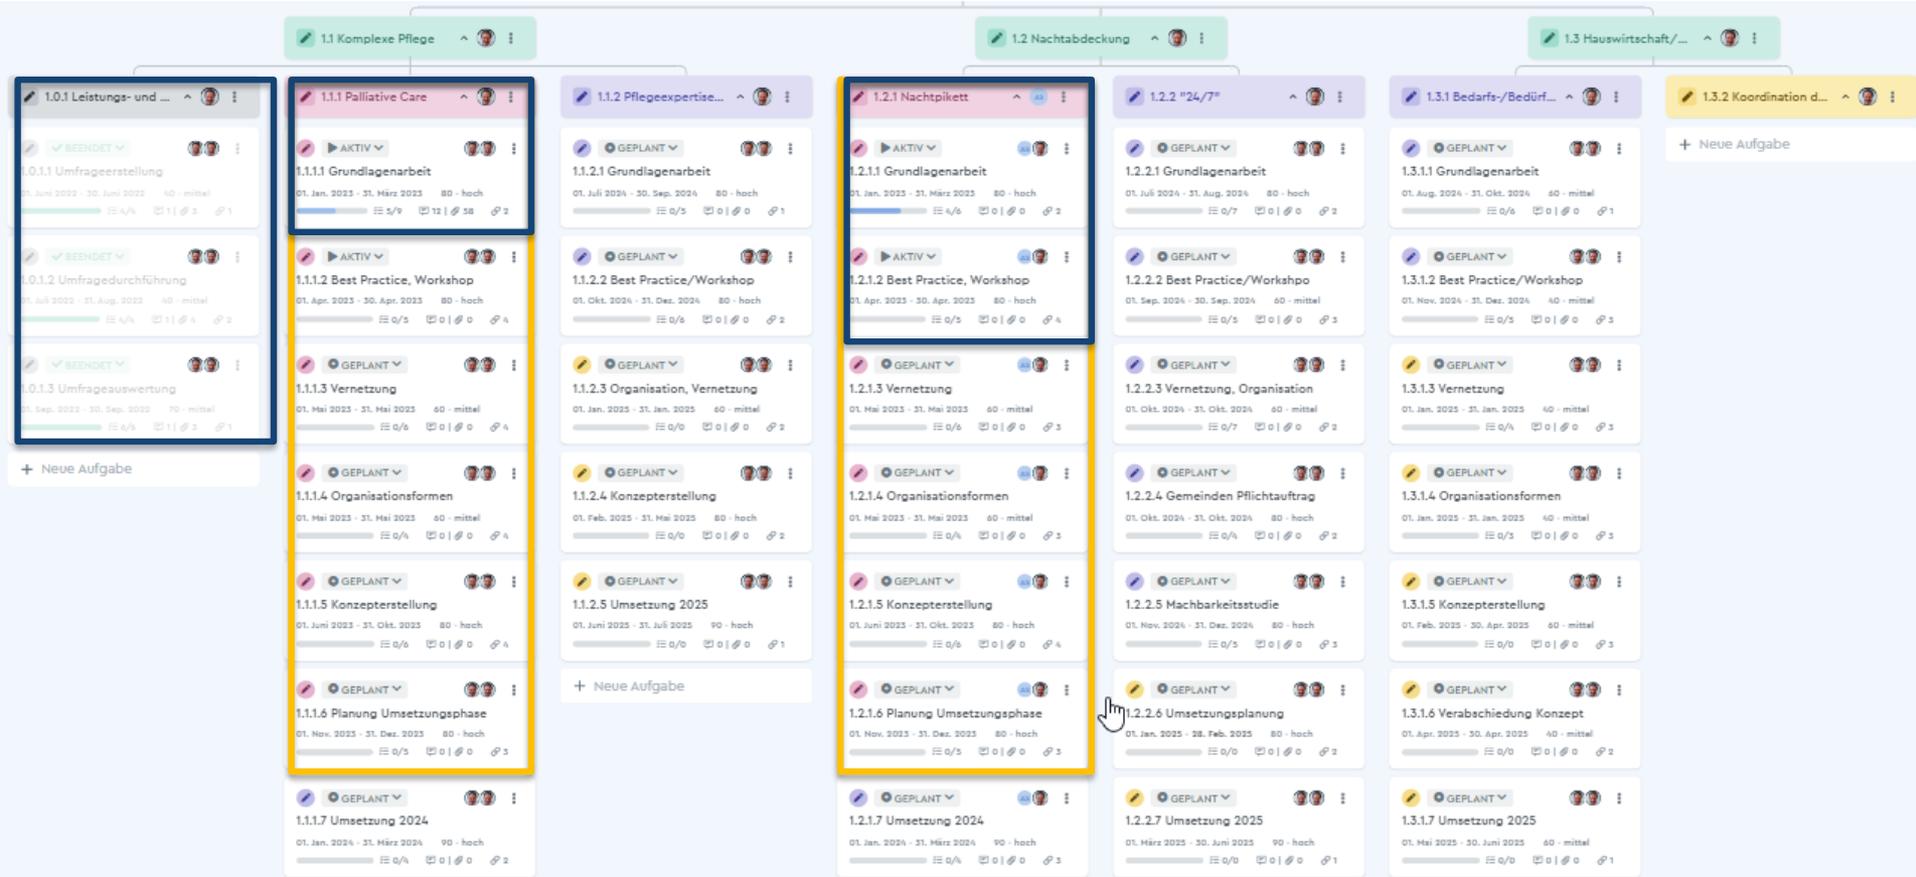

Projektbereich „Personal“ – Übersicht

Jahresprojektplanung 23/24

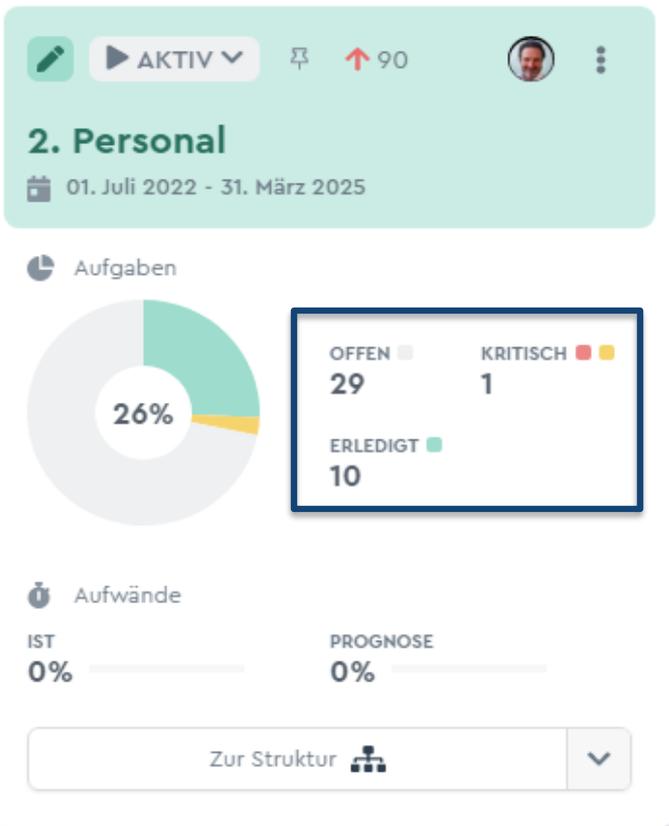

Teilprojekt «Personallumfrage»

- Realisierung: 06-22 bis 01-23
- Status: Abgeschlossen

Teilprojekt «Ausbildung»

- Realisierung: 01-23 bis 03-24
- Status: Grundlagenarbeit

Teilprojekt «Personalgewinnung auf ext. Arbeitsmarkt»

- Realisierung: 10-22 bis 12-23
- Status: Begleiten Expertenauftrag

Teilprojekt «Fort-/Weiterbildung»


- Realisierung: 01-23 bis 12-23
- Status: Grundlagenarbeit

Teilprojekt «Wiedereinsteiger/-innen»

- Realisierung: 08-22 bis 12-22
- Status: Abgeschlossen

Projektbereich „Personal“ – Status

Jahresprojektplanung 23/24

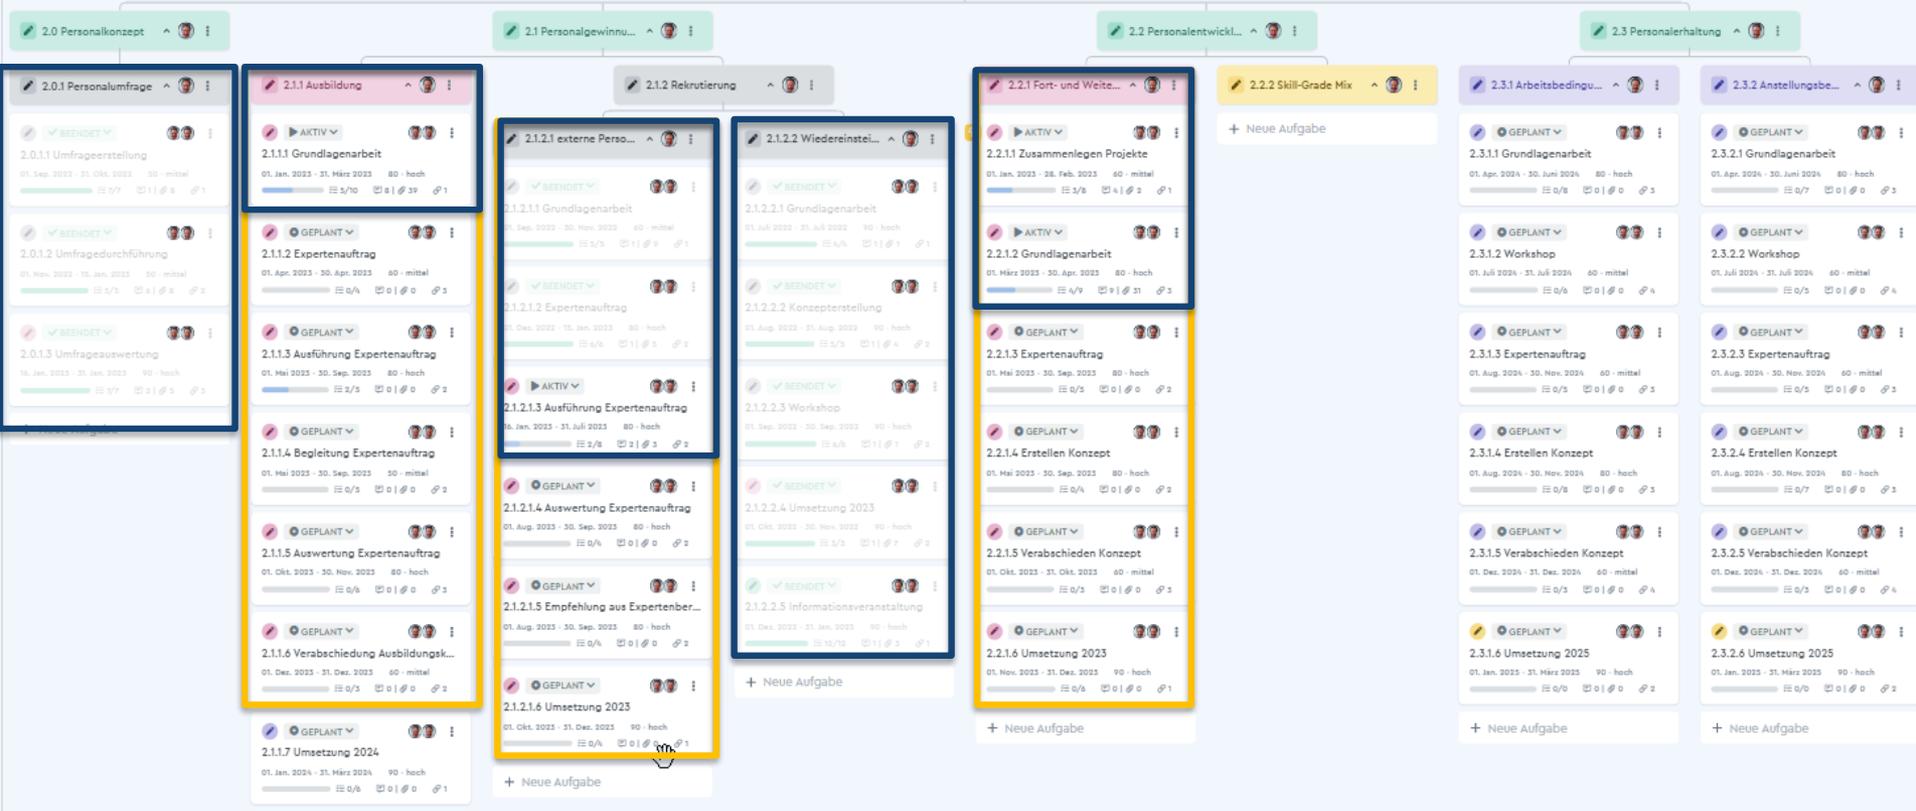

Projektbereich „Klient-Umfeld-Kultur“ – Übersicht

Jahresprojektplanung 23/24

AKTIV 50

3. Klient-Umfeld-Kultur

01. Jan. 2023 - 30. Juni 2024

Aufgaben

0%

OFFEN	KRITISCH
10	0
ERLEDIGT	
0	

Aufwände

IST
0%

PROGNOSE
0%

Zur Struktur



Teilprojekt «Sturzprophylaxe»

- Realisierung: 01-23 bis 06-24
- Status: Projektvorbereitung

Teilprojekt «Lernwerkstatt für pflegende Angehörige»

- Realisierung: 01-23 bis 06-24
- Status: Projektvorbereitung

Teilprojekt «Kooperation mit Dritten»

- Realisierung: 01-23 bis 09-23
- Status: Grundlagenarbeit, Workshop

Projektbereich „Klient-Umfeld-Kultur“ – Status

Jahresprojektplanung 23/24

The screenshot displays a project management interface with a hierarchical structure. The main categories are 3.1 Pflege-/Betreuung, 3.2 Angehörige/Umfeld, and 3.3 Kooperationsnetz. Each category has sub-categories and tasks. The tasks are color-coded by status: pink for 'AKTIV' and light blue for 'GEPLANT'. Each task card shows a title, a date range, a priority level, and progress indicators.

Category	Sub-Category	Task	Status	Start	End	Priority	Progress	
3.1 Pflege-/Betreuung	3.1.2 Prävention	3.1.2.1 Sturzprävention	AKTIV	01. Jan. 2023	31. Dec. 2023	40 - mittel	1/1	
		3.1.2.1.1 Projektvorbereitung	AKTIV	01. Jan. 2023	31. Dec. 2023	40 - mittel	1/1	
		3.1.2.1.2 Workshop	GEPLANT	01. Jan. 2024	31. März 2024	60 - mittel	0/0	
	3.1.3 Pflege-/Betreuung	3.1.3.1	3.1.3.1.1 Projektvorbereitung	GEPLANT	01. Jan. 2024	31. März 2024	60 - mittel	0/0
		3.1.3.1	3.1.3.1.2 Workshop	GEPLANT	01. Jan. 2024	31. März 2024	60 - mittel	0/0
		3.1.3.1	3.1.3.1.3 Umsetzung 2024	GEPLANT	01. Apr. 2024	30. Juni 2024	80 - hoch	0/0
3.2 Angehörige/Umfeld	3.2.1 Befähigung Ang...	3.2.1.1 Lernwerkstatt	AKTIV	02. Jan. 2023	31. Dec. 2023	40 - mittel	1/1	
		3.2.1.1.1 Projektvorbereitung	AKTIV	02. Jan. 2023	31. Dec. 2023	40 - mittel	1/1	
		3.2.1.1.2 Workshop	GEPLANT	01. Jan. 2024	31. März 2024	60 - mittel	0/0	
	3.2.2 Integration An...	3.2.2.1	3.2.2.1.1 Projektvorbereitung	GEPLANT	01. Jan. 2024	31. März 2024	60 - mittel	0/0
		3.2.2.1	3.2.2.1.2 Workshop	GEPLANT	01. Jan. 2024	31. März 2024	60 - mittel	0/0
		3.2.2.1	3.2.2.1.3 Umsetzung 2024	GEPLANT	01. Mai 2024	30. Juni 2024	80 - hoch	0/0
3.3 Kooperationsnetz	3.3.1 Kooperation mi...	3.3.1.1 Grundlagenarbeit, Workshop	AKTIV	01. Jan. 2023	30. Apr. 2023	80 - hoch	2/10	
		3.3.1.2 Arbeitsgruppen, Plattformen	GEPLANT	01. Mai 2023	30. Juni 2023	70 - mittel	0/5	
		3.3.1.3 Möglichkeiten, Konzepte	GEPLANT	01. Juli 2023	31. Aug. 2023	80 - hoch	0/5	
		3.3.1.4 Umsetzung 2023	GEPLANT	01. Sep. 2023	30. Sep. 2023	80 - hoch	0/0	


Projektbereich „Organisation/Wirtschaftl.“ – Übersicht

Jahresprojektplanung 23/24



Projektbereich „Organisation/Wirtschaftl.“ – Status

Jahresprojektplanung 23/24

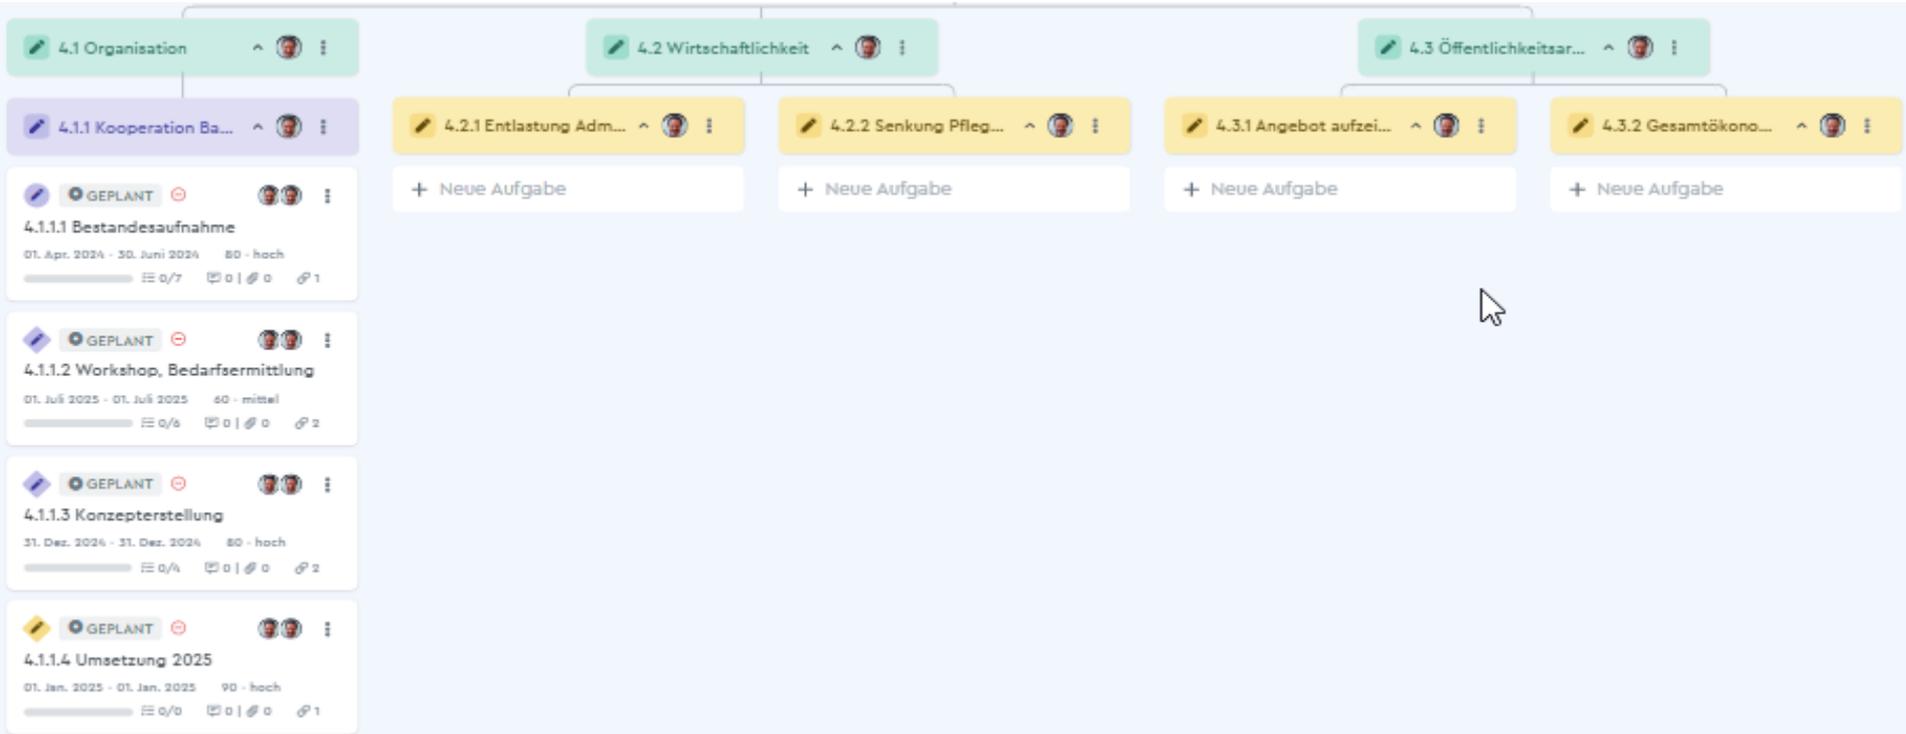

Engagement Spitex und Kooperationspartner

Gesamtübersicht

	Steuergruppe	Projektteam	Palliative Care	Nachtpikett	Ausbildung	Fort-/Weiterbildung	Personalgewinnung	Sturzprophylaxe	Lernwerkstatt	Kooperation Dritte
SKSZ Verband (22)	3	4	1	1	2	2	1	2	2	4
Spitex-Organ. (16)	4	2	4		2	2	2			
Spitäler (8)	1		1		3 (*)	3 (*)				
Curaviva (4)	1	1			1	1				
Pro Senectute (1)	1									
SRK (1)	1									
Expertenmandate (1)							1			
Total (53)	11	7	6	1	8	8	4	2	2	4

➤ Spitäler (*) => Zusammenarbeit OHNE Abgabe Dokumente

Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern

Spitäler	
Ansprache:	Über Peter Schmid, 3 Spitäler
Reaktion:	<ul style="list-style-type: none"> Keine Dokumente werden abgegeben Unterstützung und Mitarbeit bei Workshops möglich
Kontakte:	<ul style="list-style-type: none"> 3 Spitäler mit HR-Verantwortlichen Interesse und wollen mitarbeiten und unterstützen
Teilprojekte:	<ul style="list-style-type: none"> Ausbildung => Unterstützung, ohne Unterlagen Fort-/Weiterbildung => Unterstützung, ohne Unterlagen Palliative Care => Projektmitarbeit Nachtpikett => Projektmitarbeit
Curaviva	
Ansprache:	Über Corinne Heck, alle APH an GL-Sitzung
Reaktion:	<ul style="list-style-type: none"> Rubiswil Schwyz Obigrueh Schübelbach
Kontakte:	<ul style="list-style-type: none"> Geschäftsleitungen
Teilprojekte:	<ul style="list-style-type: none"> Ausbildung => Unterlagen erhalten Fort-/Weiterbildung => Unterlagen erhalten Wiedereinsteiger/-innen => Unterlagen erhalten, Kooperation in Klärung (Stefan Imhof)



Termine

Versand Finanzierungsgesuche 2024 an die Gemeinden	31.03.2023
Sitzung Steuergruppe	05.04.2023
Delegiertenversammlung	15.06.2023
Sitzung Projektteam	21.06.2023
Sitzung Steuergruppe	27.06.2023
Workshop Präsident/-innen und Geschäftsleitungen	20.09.2023
